

# CABEÇALHO


## 748 X 118

### Cliente

ALVES DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA - ME  
21.111.111/1000-11

### Localização do Poço

Local	
RESIDENCIA XXXXXXXXXXXXXXXX	
Logradouro	
RUA VITORIA REGIA	
n°	Complemento
27	FUNDOS
Bairro	Cidade
JARDIM DAS PALMEIRAS	BRASILIA
UF CEP	
DF 78080180	
Dados Extras de Localização	
passando a ponte, vire a esquadra, depois a direita, direita novamente, vire a esquadra, depois a direita, direita novamente, quando voce notar que esta perdido é porque voce chegou no local	

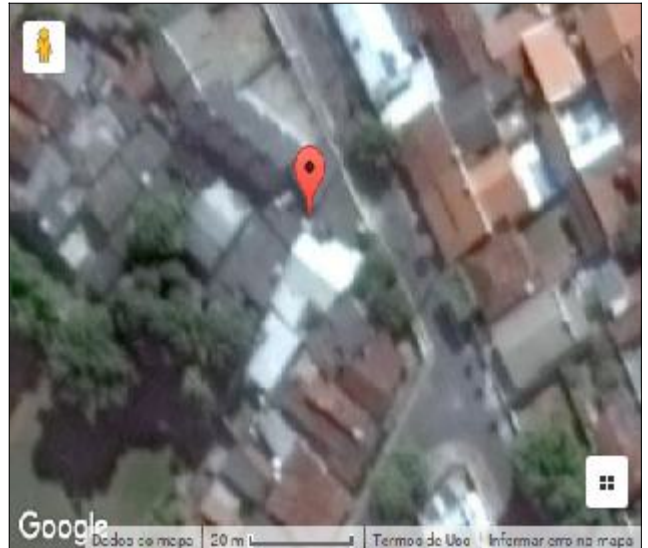

## RESUMO DO TESTE DE BOMBEAMENTO

### TESTE REALIZADOS

06/04/2016 - 00:32:00 as 08/04/2016 - 05:32:00

VAZÃO	24	Duração(Horas)
RECUPERAÇÃO	4	Duração(Horas)
ESCALONADO	4	Duração(Horas)

### RESUMO DO TESTE

Vazão:	283,90	m <sup>3</sup> / h	Rebaixamento:	67,30	m
Nível Estático:	130,26	m	Nível Dinâmico:	197,56	m
Crivo:	226,57	m	Vazão Específica:	4,2184	m <sup>3</sup> /h/m
Altura Manométrica Total	600,00	m	Método de Interpretação	THEIS	

### INTERPRETAÇÃO DOS TESTES DE BOMBEAMENTO

Rebaixamento Especifico:	0,237	m/m <sup>3</sup> /h	Eficiência Hidráulica:	64,79	%
Perda de Carga do Aquífero (B):	0,13732535	h/m <sup>2</sup>	Coefficiente de Transmissividade:	60,01	m <sup>2</sup> /dia
Perda de Carga do Poço (C):	0,0002628343	h/m <sup>5</sup>			

### CONJUNTO BOMBEADOR

Motor				Bombeador		
Marca	HP	Modelo	Tensão	Tipo	Modelo	Estagios
EBARA	25	M6G	440	MONOTRI	EBARA BHS412	35

# CABEÇALHO

## 748 X 118

### TESTE DE BOMBEAMENTO

Proprietario ALVES DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA - ME C.P.F./C.N.P.J 21.111.111/1000-11 Folha 1 de 1  
 Poço 4 UF DF Municipio BRASILLIA ART 2432.32423434.234.32423-34  
 Tipo de Teste VAZÃO Etapa 000 Norma: NBR 12244 ABR 1992 Crivo 226,57 N.E. 130,26

#### Responsavel

Nome GEOLOGO 2  
 CREA CREA 2342134/MT

C.P.F. 222.222.222-22

Assinatura

#### Coordenada

Graus, Min. e Seg.  
 Lat. --15°--33'--52,7 Long. 25°54'06,791"O

Graus Dec.  
 Lat. 15,5646475 Long. -25,9018864


UTM  
 Lat. 11715312,39 Long. 617351,35 MC 12 Alt.(m) 1115

#### Periodo

Inicial Data. 06/04/2016 Hora 00:32:00 Final Data. 07/04/2016 Hora 00:32:00

Hora	t (min)	N.D. (m)	Q (m³/h)	s med (m)
0:33:00	0001	154,20	312,800	23,94
0:34:00	0002	166,75	312,800	36,49
0:35:00	0003	167,50	312,800	37,24
0:36:00	0004	168,46	311,300	38,20
0:37:00	0005	169,66	309,700	39,40
0:38:00	0006	170,81	308,900	40,55
0:39:00	0007	171,65	308,100	41,39
0:40:00	0008	172,32	307,300	42,06
0:41:00	0009	173,03	307,300	42,77
0:42:00	0010	174,00	306,500	43,74
0:44:00	0012	174,58	304,900	44,32
0:46:00	0014	175,00	304,100	44,74
0:48:00	0016	176,34	304,100	46,08
0:50:00	0018	177,14	303,300	46,88
0:52:00	0020	177,80	302,400	47,54
0:57:00	0025	179,24	300,800	48,98
1:02:00	0030	180,37	300,000	50,11
1:07:00	0035	181,45	298,300	51,19
1:12:00	0040	182,37	297,500	52,11
1:17:00	0045	182,37	297,500	52,11
1:22:00	0050	184,77	296,700	54,51
1:32:00	0060	184,98	296,700	54,72
1:42:00	0070	186,00	295,000	55,74
1:52:00	0080	186,77	294,200	56,51
2:02:00	0090	187,33	293,300	57,07
2:12:00	0100	189,00	293,300	58,74
2:42:00	0130	190,03	293,300	59,77
3:12:00	0160	191,04	290,800	60,78
3:42:00	0190	191,92	290,800	61,66
4:12:00	0220	192,35	290,800	62,09
4:42:00	0250	193,40	290,800	63,14
5:12:00	0280	193,40	289,100	63,14
5:42:00	0310	193,71	289,100	63,45
6:12:00	0340	194,03	287,400	63,77
6:42:00	0370	194,57	287,400	64,31
7:12:00	0400	195,27	286,500	65,01

Hora	t (min)	N.D. (m)	Q (m³/h)	s med (m)
7:42:00	0430	195,01	286,500	64,75
8:12:00	0460	195,54	285,700	65,28
8:42:00	0490	195,80	284,800	65,54
9:12:00	0520	196,12	284,800	65,86
10:12:00	0580	196,29	284,800	66,03
11:12:00	0640	196,50	284,800	66,24
12:12:00	0700	196,64	284,800	66,38
13:12:00	0760	196,64	284,800	66,38
14:12:00	0820	196,82	284,800	66,56
15:12:00	0880	197,00	283,900	66,74
16:12:00	0940	197,16	283,900	66,90
17:12:00	1000	197,20	283,900	66,94
18:52:00	1100	197,20	283,900	66,94
20:32:00	1200	197,29	283,900	67,03
22:12:00	1300	197,32	283,900	67,06
23:52:00	1400	197,57	283,900	67,31
0:32:00	1440	197,56	283,900	67,30

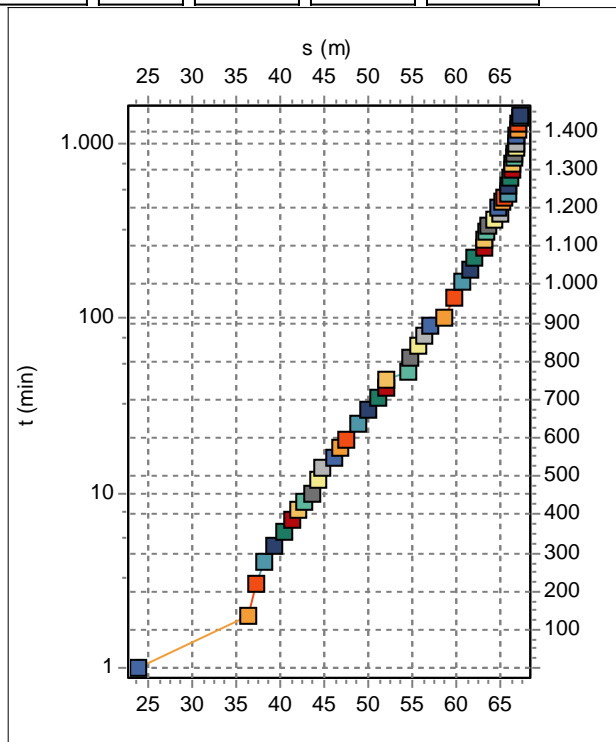

# CABEÇALHO

## 748 X 118

### TESTE DE BOMBEAMENTO

Proprietario ALVES DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA - ME C.P.F./C.N.P.J 21.111.111/1000-11 Folha 1 de 1

Poço 4 UF DF Municipio BRASILLIA ART 2432.32423434.234.32423-34

Tipo de Teste RECUPERAÇÃO Etapa 000 Norma: NBR 12244 ABR 1992 Crivo 226,57 N.E. 130,26

Responsavel

Nome GEOLOGO 2

CREA CREA 2342134/MT

C.P.F.

Assinatura

Coordenada

Graus, Min. e Seg.  
Lat. --15°--33'--52,7 Long. 25°54'06,791"O

Graus Dec.  
Lat. 15,5646475 Long. -25,9018864

UTM  
Lat. 11715312,39 Long. 617351,35 MC 12 Alt.(m) 1115

Periodo

Inicial Data. 08/04/2016 Hora 01:32:00 Final Data. 08/04/2016 Hora 05:32:00

Hora	t (min)	N.D. (m)	Q (m³/h)	s med (m)
1:33:00	0001	170,95	0,000	40,69
1:34:00	0002	166,56	0,000	36,30
1:35:00	0003	164,40	0,000	34,14
1:36:00	0004	163,10	0,000	32,84
1:37:00	0005	162,00	0,000	31,74
1:38:00	0006	161,04	0,000	30,78
1:39:00	0007	160,19	0,000	29,93
1:40:00	0008	159,43	0,000	29,17
1:41:00	0009	158,74	0,000	28,48
1:42:00	0010	158,15	0,000	27,89
1:44:00	0012	157,05	0,000	26,79
1:46:00	0014	156,04	0,000	25,78
1:48:00	0016	155,17	0,000	24,91
1:50:00	0018	154,36	0,000	24,10
1:52:00	0020	152,08	0,000	21,82
1:57:00	0025	152,08	0,000	21,82
2:02:00	0030	150,74	0,000	20,48
2:07:00	0035	149,61	0,000	19,35
2:12:00	0040	148,63	0,000	18,37
2:17:00	0045	147,79	0,000	17,53
2:22:00	0050	147,02	0,000	16,76
2:32:00	0060	145,68	0,000	15,42
2:42:00	0070	144,59	0,000	14,33
2:52:00	0080	143,77	0,000	13,51
3:02:00	0090	142,98	0,000	12,72
3:12:00	0100	141,22	0,000	10,96
3:42:00	0130	139,80	0,000	9,54
4:12:00	0160	139,80	0,000	9,54
4:42:00	0190	138,92	0,000	8,66
5:12:00	0220	136,05	0,000	5,79
5:32:00	0240	135,42	0,000	5,16

